PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES

État de situation

21 mai 2021

Votre gouvernement

Québec

LOCALISATION

PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES

CARACTÉRISTIQUES

- **Longueur :** 2 km / 35 travées / 6 voies de circulation
- **DJMA :** 87 000 (données de 2019) dont **12 % de camions**
- **DJMA actuel :** 70 000 (mai 2021, COVID) dont **12 % de camions**
- 2 travées en **porte à faux** au-dessus des chenaux de navigation

HISTORIQUE

- **1965** ➡ Mise en service
- **1990 à 2000** ➡ Diverses interventions de renforcement de poutres de rive
- **2012** ➡ Travaux d'installation de tiges de renforcement
- Depuis **2016** ➡ Programme de maintien et d'accompagnement

TYPE DE STRUCTURE

Structure du pont de l'Île-aux-Tourtes

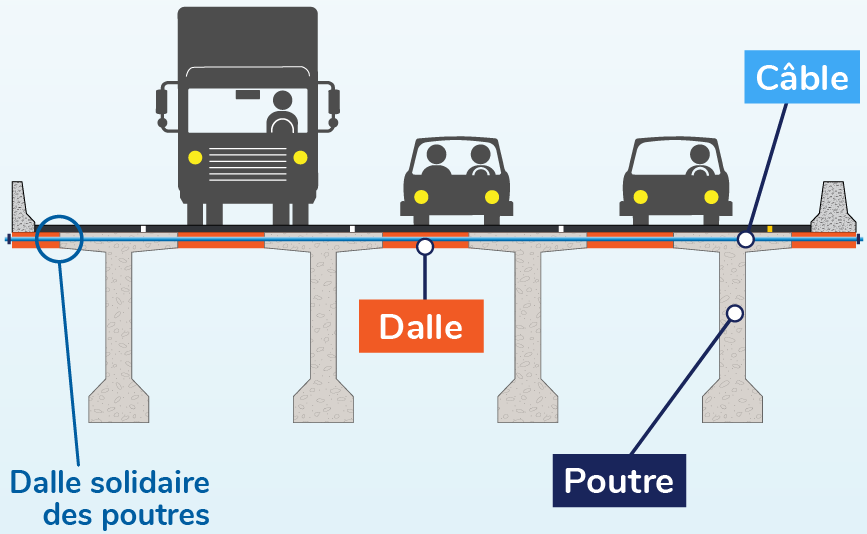

Structure conventionnelle

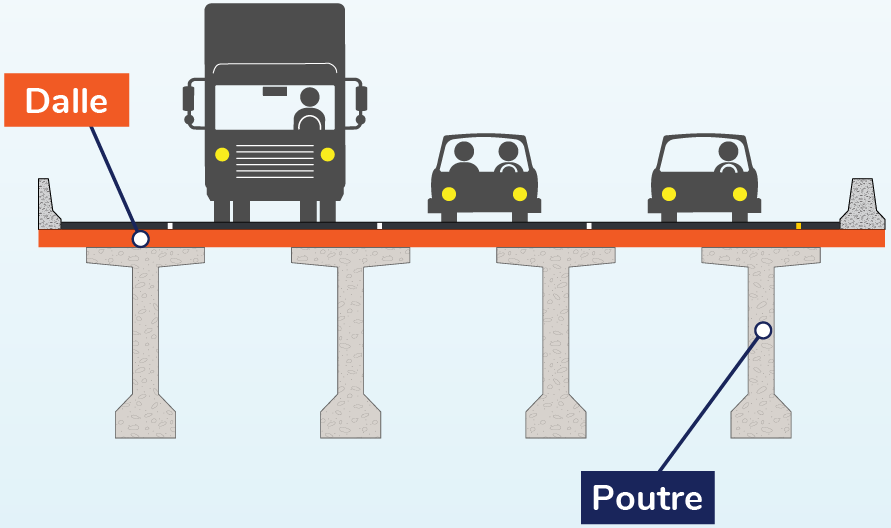

RAPPEL DES INTERVENTIONS DES DERNIÈRES ANNÉES

PROGRAMME DE MAINTIEN (depuis 2016)

Programme de suivi et de surveillance en continu

- **Inspection** et suivi en continu
- Évaluation de la **capacité portante**
- **Planification** (recommandation sur des travaux à réaliser)
- **Conception** (avant-projets et plans/devis)
- Contrats de **construction** (plusieurs lots)
- **Surveillance**

Investissements :

- **Avant 2021 : 110,4 M$**
- **2021-2031 : 172,4 M$, dont 23 M$ en 2021**

PROGRAMME DE MAINTIEN

EXEMPLES DE TRAVAUX

Photo utilisée à titre d’exemple seulement

LOCALISATION DES TRAVAUX

TRAVAUX EN COURS

TRAVAUX EN COURS

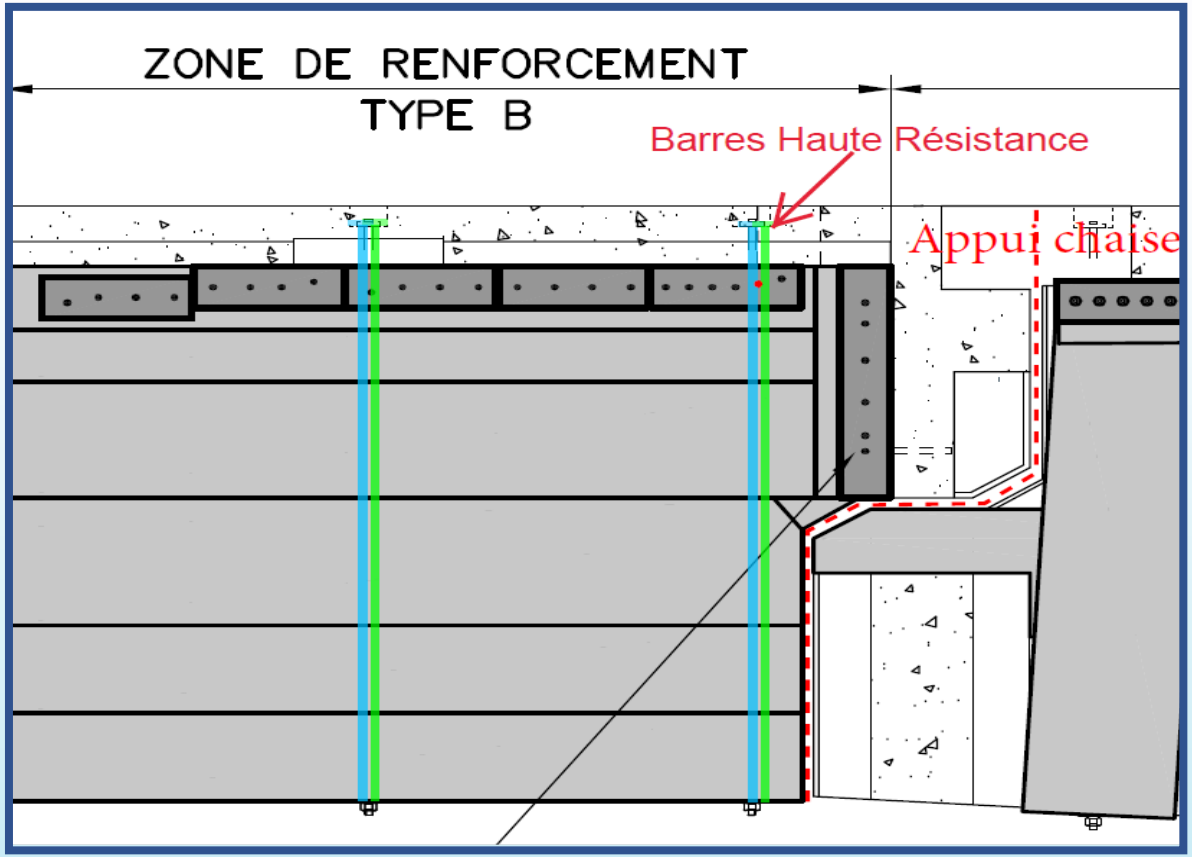

TRAVAUX EN COURS

- **30 avril** ➡ observation d'une **tige sectionnée** poutre de rive, **fermeture d'une voie**
- **12 mai** ➡ observation d'une **tige endommagée** poutre centrale, **fermeture d'une 2e voie**
- **Depuis le 12 mai** ➡ relevés et analyses structurales supplémentaires sur l'ensemble des tiges
- **20 mai** ➡ **FERMETURE DU PONT**

Détour direction ouest

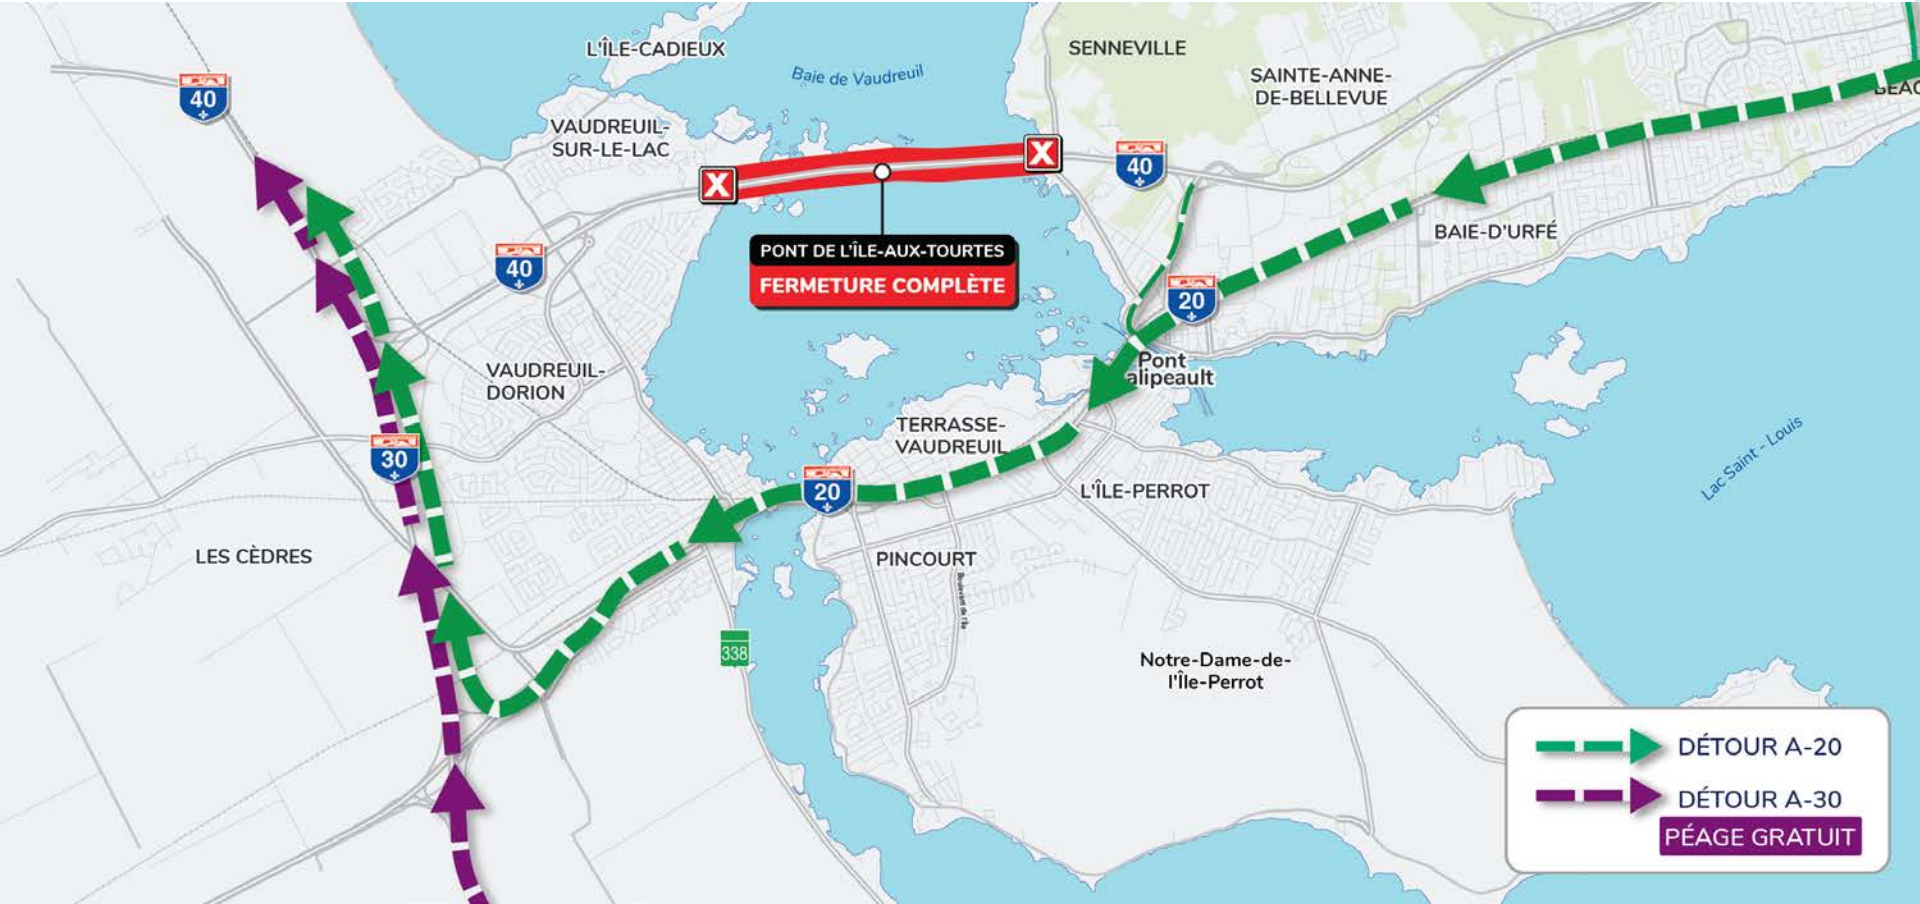

Détour direction est

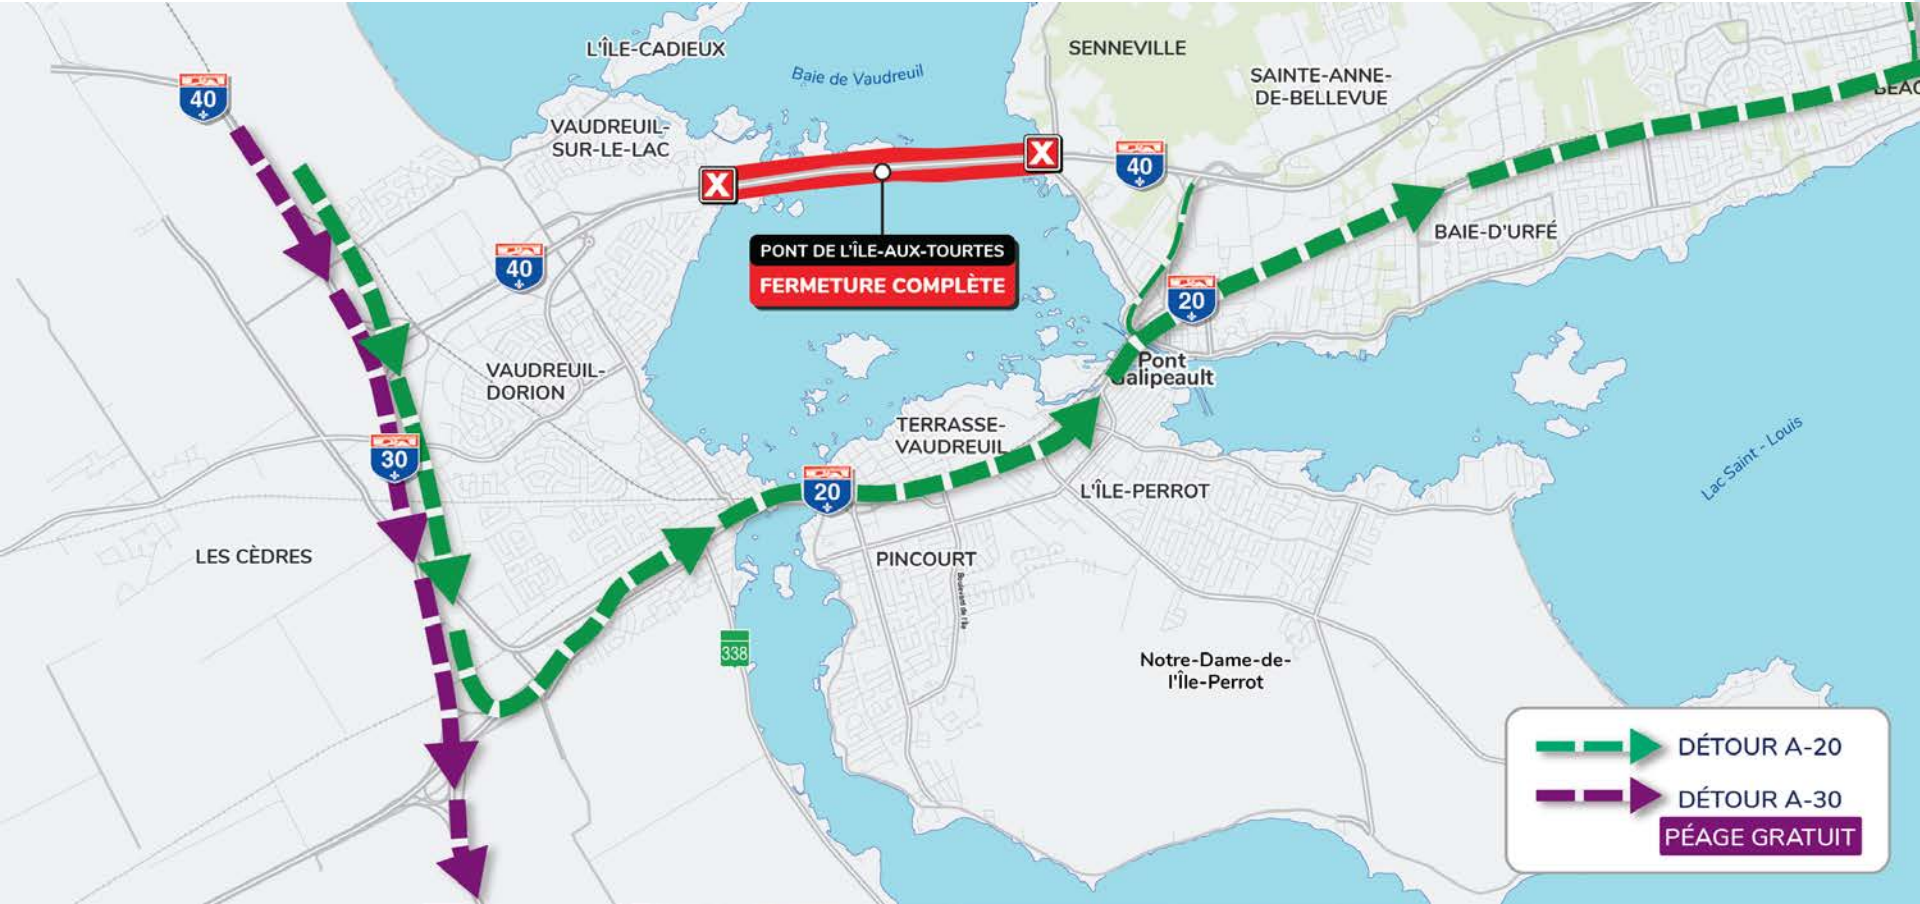

Prochaine étape

- Les analyses sont en cours pour déterminer **la meilleure intervention** en vue de procéder à la **réouverture** du pont **dans les plus brefs délais**

PROJET DE RECONSTRUCTION

PROCHAINES ÉTAPES

- Obtention du décret du MELCC
- Appel de qualification pour le contrat de conception, construction et financement (CCF)
- Appel de proposition pour le contrat CCF
- Dépôt du dossier d'affaires
- Réalisation des travaux
- **Projet visé par la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure**
